


Ситуационный план:

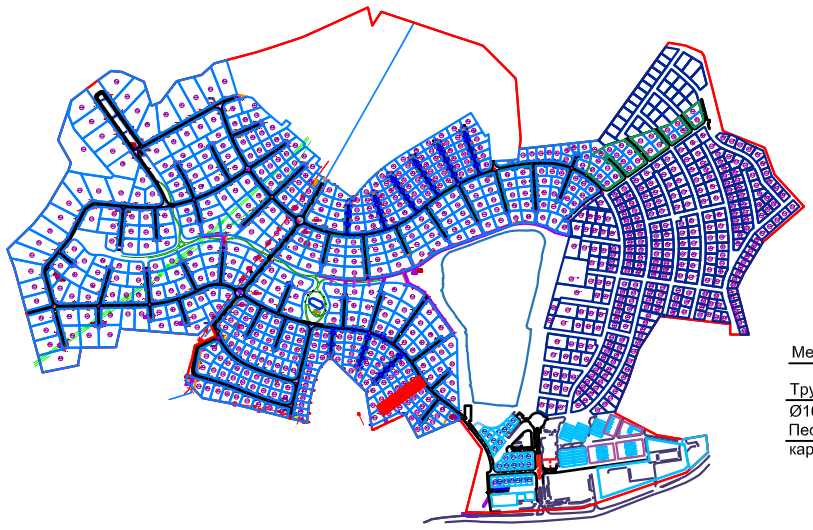


1-1

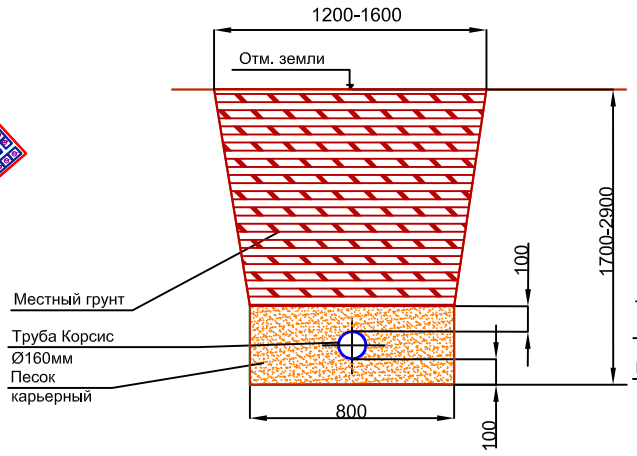

2-2

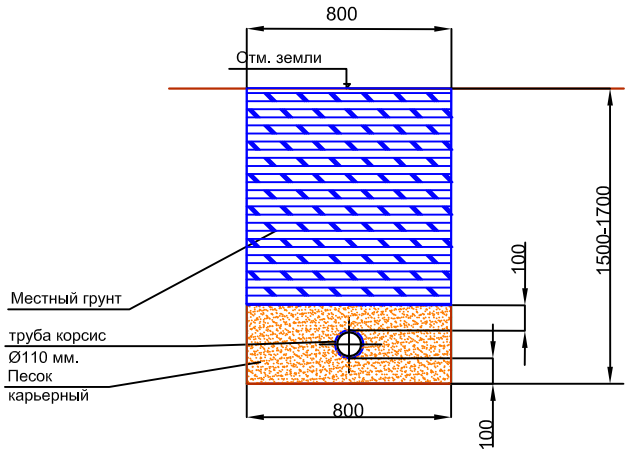

Типовой конструктив сборного Ж/Б колодца

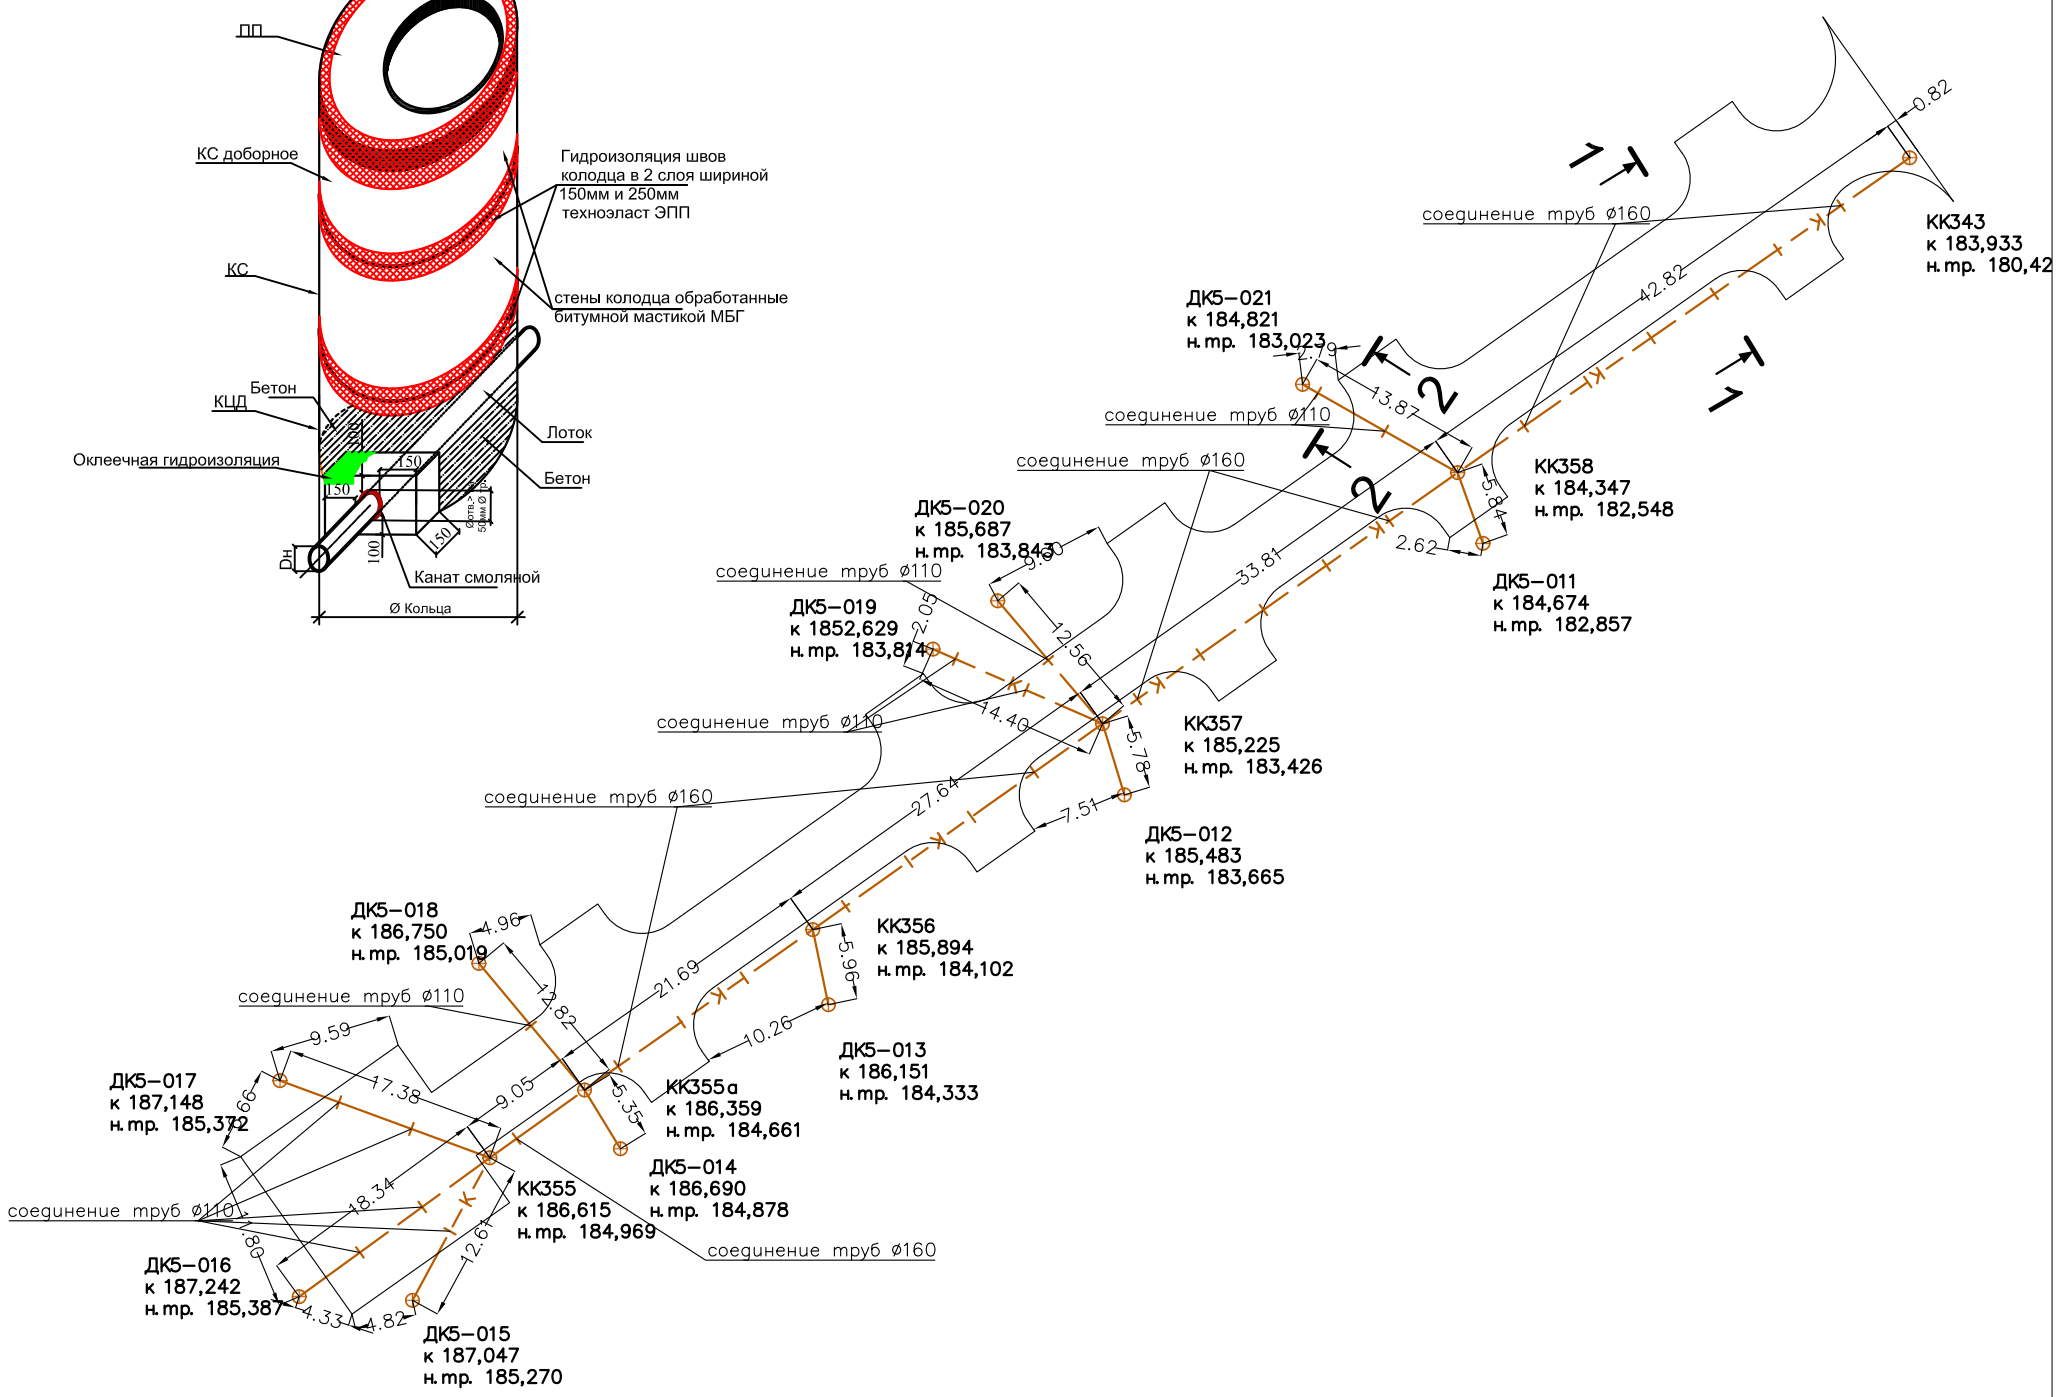

Ведомость расхода материалов:

– труба корсис ø110 мм.:
17,38+18,34+12,61+12,81+5,35+5,96
+5,78+12,56+14,4+13,87+5,84
=124,91 м. п.
– труба корсис ø160 мм.:
9,05+21,69+27,64+33,81+42,82
=135,01 м. п.

– соединения труб ø160 мм.: 19 шт.
– соединения труб ø110 мм.: 11 шт.

				ИС–3КК–40V			
				Московская область, городской округ Истра, с/п. Павло– Слободское, д. Исаково.			
Должность	Ф. И. О.	Подпись	Дата				
				Устройства трубопровода	стадия	лист	листов
геодезист	Голубев П. В.				ИД	4	8
				от колодца КК355 до КК343 план, разрезы	ООО "Лика"		
